

TOP

Gremium	Termin	Status
Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen	07.09.2018	öffentlich

Vorlage der Verwaltung**Kanalsanierung Wredestraße, Erweiterung der Maßnahmegenehmigung**

Vorlage Nr.: 20186137

A N T R A G

Der Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Maßnahme Kanalsanierung Wredestraße

um **178.000 EUR (einschl. 19 % MwSt.)**auf **903.000 EUR (einschl. 19% MwSt.)**

wird genehmigt.

Begründung und Beschreibung der Maßnahme

Im Werkausschuss am 09.03.2018 wurde die Kanalsanierung Wredestraße mit Gesamtkosten in Höhe von 725.000 EUR auf Basis der Kostenberechnung genehmigt. Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und am 08.08.2018 submittiert. Die Submissionsergebnisse lagen, nach Wertung des Nebenangebotes der Firma Friedrich Eisen, zwischen rd. 622.000 Euro und rd. 1.009.000 Euro.

Nach diesen vorliegenden Erkenntnissen übersteigen die veranschlagten Gesamtkosten den genehmigten Kostenrahmen, so dass eine Erhöhung der Maßnahmegenehmigung notwendig wird.

II. Begründung der Kostenerhöhung

Aufgrund der Bedeutung der Wredestraße als Verkehrsstraße wurde die Ausführungsplanung dahingehend optimiert, die Beeinträchtigungen für den Verkehr und die Anwohner sowie das ansässige Gewerbe (Apotheke, Ärzte, Kleinhändler) so gering wie möglich zu gestalten. Um dies zu erreichen werden die Hausanschlussleitungen aus dem Rohrgraben heraus in Stollenbauweise saniert. Bei dieser Vorgehensweise wird eine Optimierung des Bauablaufs und der Bauzeit erreicht. Es wird gewährleistet, dass die Wredestraße jederzeit befahrbar und die Gehwege begehbar sind. Die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage am Pfalzbau ist von der Wredestraße aus während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Des Weiteren ist aus Sicht des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, das Submissionsergebnis konjunkturbedingt höher als erwartet.

III Kosten der Maßnahme

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme betragen:

	alt	neu	Erhöhung
Reine Baukosten für Hauptkanal und Anschlüsse	445.000 €	623.000 €	178.000 €
Ingenieurleistungen und Projektsteuerung	105.000 €	105.000 €	0 €
Bodenuntersuchung und Beweissicherung	50.000 €	50.000 €	0 €
Auffüllmaterial	40.000 €	40.000 €	0 €
Deponiekosten	85.000 €	85.000 €	0 €
Gesamtsumme	725.000 €	903.000 €	178.000 €

Nach Kanalarten aufgeschlüsselt betragen die Gesamtkosten voraussichtlich:


Gesamtkosten Hauptkanal	521.000 €
Gesamtkosten Hausanschlüsse	306.000 €
Gesamtkosten Sinkkastenleitungen	76.000 €

IV Mittelbedarf

2018	150.000 €
2019	753.000 €

V. Verfügbare Mittel

Die Mittel stehen im Wirtschaftsjahr 2018 unter der SAP-Nummer 50.000.577 zur Verfügung bzw. werden im Wirtschaftsplan des kommenden Jahres eingestellt. Von der Kanalsanierungsmaßnahme werden anteilig rd. 164.500 Euro über Mittel der Straßenausbaubeiträge finanziert.

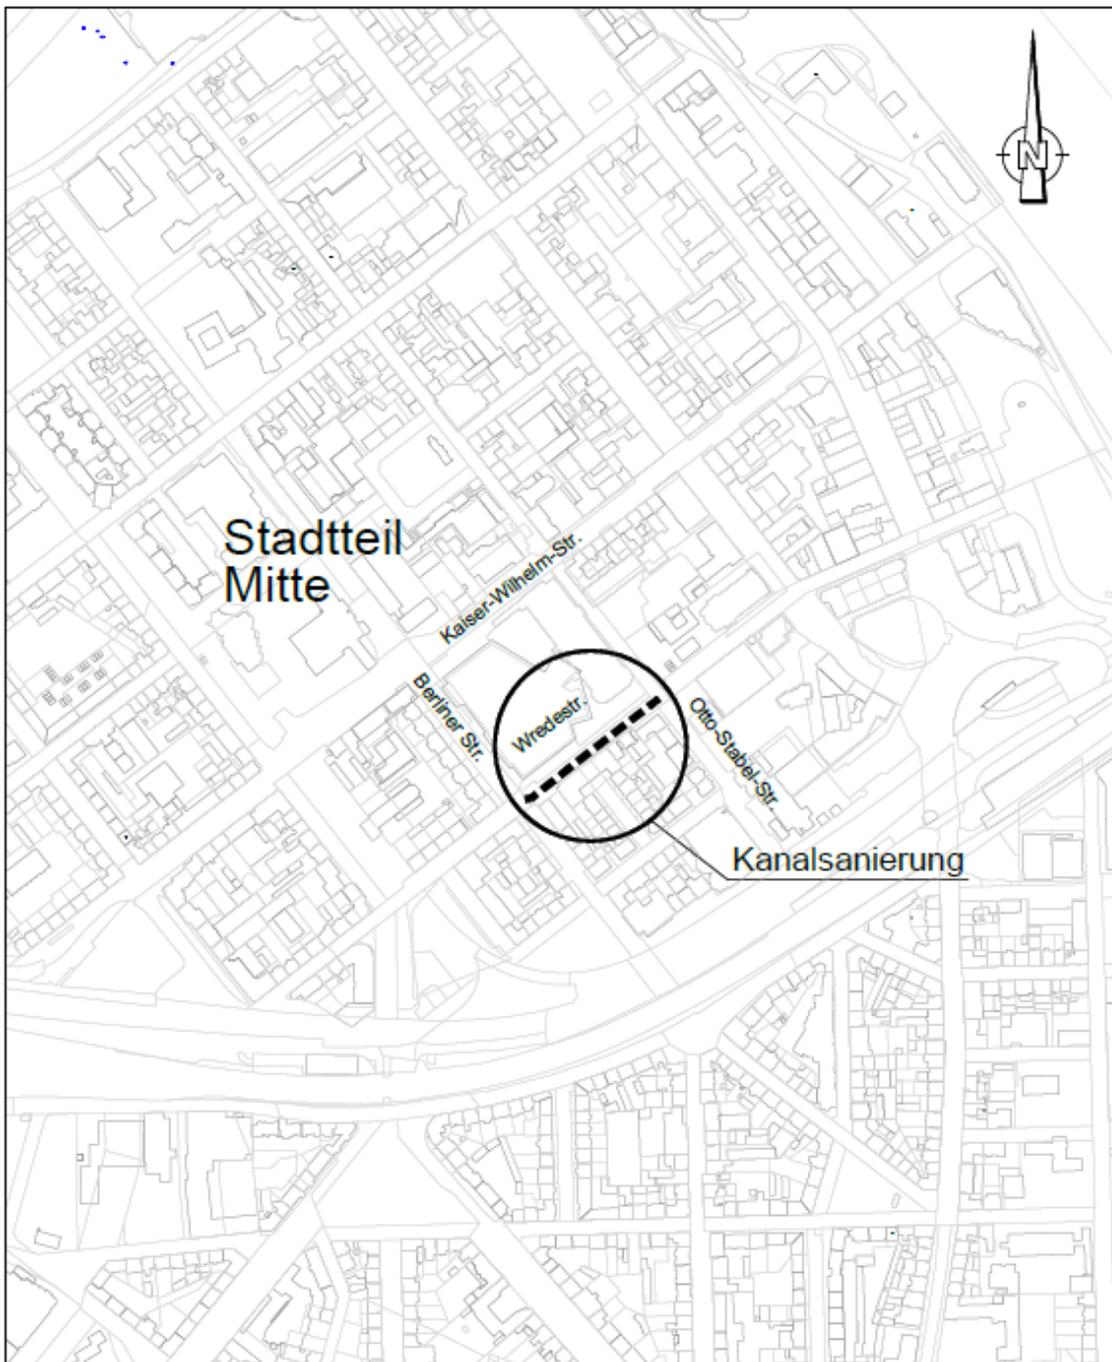

WBL Wirtschaftsbetrieb
Ludwigshafen (WBL)
Eigenbetrieb der Stadt
Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Stadtteil: LU - Mitte
Straße: Wredestraße
Projekt: 07 Mi 62A, Kanalsanierung
Maßstab: 1 : 5000
